

新潟大学(旭町)医歯学総合病院西病棟等空調設備改修工事



改修前



改修後

工事概要

空調設備の老朽化改善改修

医歯学総合病院の空調設備は設置後15年が経過し、室外機が経年劣化による腐食が著しく故障が頻発していた。病棟食堂用空調機の改修は、工期の短縮及び工事費用の縮減に配慮し、既存配管を再利用する方法で空調設備の室外機・室内機の改修工事を行った。厨房用冷蔵設備の工事については、改修前はバックアップ機器が無かったので、今回の改修工事では、冷蔵・冷凍庫には室内ユニットを2台設置し機器トラブル時でもバックアップ機により冷蔵・冷凍設備を使用できるものとした。

また、医療情報機器の静電気対策のため西病棟、西診療棟の医療情報サーバー機器用に加湿器の設置工事を行った。

工期 約3.5ヶ月

	西病棟	西診療棟
建築面積	2,474 m ²	2,115 m ²
延床面積	27,598 m ²	7,723 m ²
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
規模	地上12階・地下1階	地上4階



ネットワーク機器室加湿器設置

契約方式

一般競争入札総合評価落札方式(実績評価型)


工事費

機械 21,168,000 円

※工事費は全て自己資金による

施工業者

(株)繁原設備工業

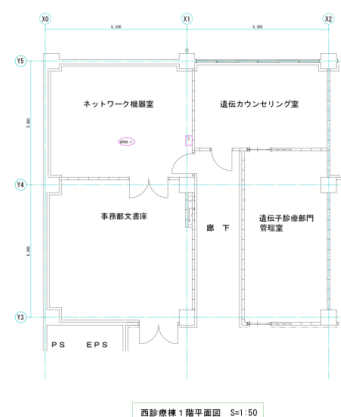

西診療棟1階平面図 S#1.50
